


建物の新築、増築、改築及び処分・分割等の履歴

S	44	3	第1-1・1-2・1-3(北棟・管理教室棟) 建築
S	45	8	第3棟(プール付属屋) 建築
S	54	3	第5棟(屋内運動場) 建築
S	55	3	第6棟(焼窯) 建築
S	57	3	第7棟(南棟) 建築
H	15	10	第1-4棟(北棟・便所等) 建築、校舎耐震補強工事(耐震ブレース4箇所、耐震コンクリート壁2箇所)
R	4	12	第5棟(屋内運動場)耐震補強工事
H	14	2	第1棟 構造体が異なっているため1-1,2,3,4に分割する

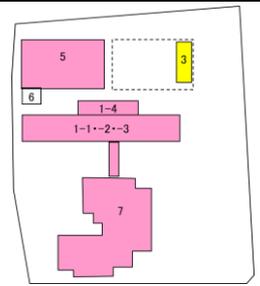


施設改修・修繕等履歴

年月	工事名	工事概要	契約金額		
H 15	4	北校舎低圧幹線改修工事	北校舎の低圧幹線の改修	997,500	
H 15	8	北校舎換気設備改修工事	換気扇8箇所、ガラリ8箇所設置	840,000	
H 15	10	第1-1棟 耐震補強工事竣工	耐震ブレース4箇所、耐震コンクリート壁2箇所・トイレ改築	69,615,000	
H 15	10	北校舎污水配管改修工事	污水配管L=10m切回し、中継ポンプ槽2台設置	4,526,550	
H 15	10	北校舎廊下床防水改修工事	A=120㎡	997,500	
H 16	1	屋内運動場屋根等改修工事	A=900㎡折板かぶせ、玄関屋根A=16㎡葺き替え	9,975,000	
H 16	2	北校舎給排水設備等改修工事	理科室給水管布設替L=50m、屋外トイレ排水管用布設替L=15m	987,000	
H 16	3	汚水中継槽警報設備工事	北校舎污水排水ポンプ制御盤2箇所の配線(職員室へ)	630,000	
H 17	8	普通教室内装改修工事	壁、床、ロッカー、黒板等	3,517,500	
H 17	9	理科室内装改修工事	アルミサッシ、床、実験台、電気設備、給水設備等改修	3,255,000	
H 18	3	プール改修工事	プール槽カバー工法、飛び込み台撤去、オーバーフロー嵩上げ	5,302,500	
H 19	3	門扉等設置工事	正門・西側通用門門扉5基、フェンスL=12m	2,527,350	
H 19	8	配膳室出入口改修工事	既設出入口撤去、アルミサッシ・腰壁等新設	462,000	
H 19	8	配膳室流し台設置工事	既設流し台撤去、新設 電源工	735,000	
H 19	10	南校舎屋根防水工事	改質アスファルトシート防水 A=258㎡	3,704,400	
H 20	8	図工室床改修	土間モルタルA=56.5㎡、塩ビシートA=63.0㎡	735,000	
H 21	1	駐車場舗装工事	駐車場舗装工事 A=430㎡、U型側溝 L=24.3m	1,594,950	
H 21	11	消火栓漏水修繕工事	配管用炭素鋼管L=3m、硬質塩ビ管L=3m 他	787,500	
H 22	5	プール水道管漏水修理工事	硬質塩化ビニール管L=79.0m、硬質塩ビライニング管L=28.0m	787,500	
H 22	8	昇降口屋根改修工事	笠木カバー・幕板パネル・下端見切カバーL=26.8m、シーリングL=81.1m	976,500	
H 23	2	屋上防水工事 A=101.5㎡	ウレタン塗膜防水A=101.5㎡、トップライト転落防止柵設置	1,995,000	
H 23	3	消火栓漏水改修工事	ユニット形消化ポンプ5.5kw交換、消火栓配管取替	2,838,150	
H 25	6	昇降口屋根防水改修工事	改質アスファルトシート防水 A=156.7㎡	997,500	
H 25	8	理科室・配膳室床改修工事	長尺塩ビシート張、配膳室A=118.6㎡、理科室A=76.8㎡	1,386,000	
H 26	8	浄化槽取替工事	浄化槽撤去、浄化槽25人槽新設	7,754,400	
H 27	1	屋内運動場地震対策工事	照明器具等落下防止対策	718,200	
H 27	11	校舎南棟屋根改修工事	改質アスファルト防水A=478㎡、笠木取替L=77.4㎡、ドレン取替7か所	5,335,200	
H 28	8	校舎屋根改修工事【音楽室】	改質アスファルトシート防水A=335㎡、パネル取替(笠木共)L=68m	8,679,960	
H 29	6	音楽室空調設備取替工事	室内機3台、室外機1台	2,073,600	
H 29	10	高置水槽取替工事	既設FRP水槽撤去、ステンレス製水槽2.3t設置	2,138,400	
H 29	10	放送設備取替工事	音声調整卓1台取替 電気設備工事一式	1,566,000	
R	3	11	防球ネット設置工事	防球ネットH=6.0m,W=12.7m範囲(投擲盤解体跡に設置)	973,500

建物の新築、増築、改築及び処分・分割等の履歴

S	43	8	第5棟(プール付属屋)・第6棟(プール付属屋) 建築
S	56	10	第7棟(管理教室棟) 建築
S	57	7	第8棟(便所) 建築
S	58	3	第9棟(屋内運動場渡り廊下) 建築

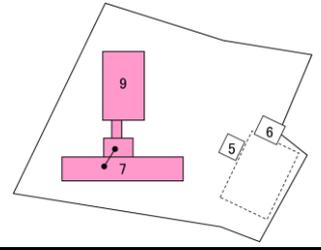


施設改修・修繕等履歴

年月	工事名	工事概要	契約金額	
H 14	6	体育館屋根防水工事	ボムシート補修及び防水	399,000
H 14	6	プール排水弁取替工事	新規排水弁取付、井戸枠及び井戸蓋取替	459,900
H 14	7	非常放送設備工事	アンプ1台、非常用スピーカー40個設置	1,837,500
H 15	7	校舎屋根防水改修工事	塩ビシートA=80㎡	983,850
H 16	2	プールろ過機取替工事	ろ過機1台、ヘアキャッチャー1台、滅菌器1台交換	4,431,000
H 19	2	消火栓管改修工事	配管用炭素鋼管改修L=22m	556,500
H 19	2	屋外消火栓管改修工事	経年劣化による漏水改修L=54.0m	955,500
H 19	3	門扉等設置工事	正門・北門・西側通用門門扉4基、メッシュフェンスL=39m	2,749,950
H 19	3	職員室屋根防水改修工事	塩ビ系シート防水A=97.9㎡	997,500
H 19	6	プール柵改修工事(他、伊久美小)	間隔が広いため取替え 25m	462,000
H 19	8	音楽室屋根防水改修工事	塩ビ系シート防水A=95.6㎡	987,000
H 20	7	普通教室等防水工事	家庭科室屋根塩化ビニール樹脂系防水 A=113㎡	997,500
H 21	1	プログラムタイマー交換工事	2回路親時計プログラムタイマー1台取替え	320,250
H 21	1	校内インターホン改修工事	インターホン親機(12局用)、ターミナルボックス各11台	456,750
H 21	8	床改修工事(保健室、教室2)	1階保健室A=23.0㎡、2階普通教室(2室)A=101.1㎡	1,800,750
H 22	3	屋根防水工事	塩ビ系防水シート A=103㎡	997,500
H 22	8	屋上防水工事	塩ビ系防水シート A=172.2㎡	1,493,100
H 22	8	屋上防水工事(その2)	塩ビ系防水シート A=93.5㎡	934,500
H 22	8	床改修工事(教室2、校長室)	普通教室(2室)、校長室 A=120.5㎡	1,785,000
H 23	2	プール槽改修工事	循環配管改修一式、防水シート張・排水バルブ改修	8,295,000
H 23	6	屋内運動場屋根防水工事	塩ビ系防水シート A=119㎡	966,000
H 24	1	屋上防水工事	塩ビ系防水シート A=124.2㎡	997,500
H 24	8	床改修工事	2教室、WS A=141㎡	1,871,033
H 25	11	消火栓配管改修工事	交換65φL=52m、50φL=37m	997,500
H 26	8	トイレ改修工事	便器洋式化 5箇所	1,242,000
H 27	3	音楽室空調機取替工事	室内機3台、室外機1台	1,630,800
H 30	11	校舎非構造部材耐震化工事	鉄骨柱設置4本、生徒用便所3箇所、職員用便所1箇所の内部CB(計7面)・2階ALC壁3面の改修	32,221,800

建物の新築、増築、改築及び処分・分割等の履歴

S	44	8	第11棟(プール付属屋) 建築
S	60	5	第10棟(管理教室棟)・第13棟(体育器具庫) 建築
S	61	3	第12棟(屋内運動場) 建築
H	5	7	第14棟(車庫) 建築



施設改修・修繕等履歴

年月	工事名	工事概要	契約金額		
H 16	1	養殖池給水工事	支柱錆取り・塗装 塩ビ管φ30 L=95m	456,750	
H 19	3	転落防止柵設置工事	フェンス設置工H=1500、L=46m	588,000	
H 19	6	プール柵改修工事(他、神座小)	間隔が広いため取替え 25m	462,000	
H 19	9	トップライト改修工事	トップライトカバー工、シーリング工	430,500	
H 20	8	床フローリング化工事	1階多目的ホールフローリング張り A=230.0㎡	2,604,000	
H 21	8	床フローリング化工事	普通教室(3室)CP室・WS A=280.8㎡	3,622,500	
H 22	8	床フローリング化工事	サタテ-2教室、1階ホール、渡り廊下 A=225.6㎡	2,890,650	
H 23	2	プール配管改修工事	硬質塩化ビニル管75A51.8m、50A23.6m、循環口8箇所取付	1,498,350	
H 23	3	屋内運動場庇屋根修繕工事	屋根GLカラーt=0.4 平葺14.1㎡修繕	462,000	
H 26	10	屋内運動場非構造部材耐震化	吊天井撤去・照明器具LED化・落下防止	10,938,582	
H 27	9	校舎屋根改修工事	直接仮設工事一式、既設屋根撤去工事 A=790㎡、屋根板金工事A=790㎡	10,260,000	
H 28	3	給水ポンプ取替工事	給水ポンプ取替1台、給水ポンプ制御盤取替一式	648,000	
H 28	8	校舎屋根改修工事	直接仮設工事一式、既設屋根撤去A=750㎡、屋根ガルバリウム鋼板立平葺A=750㎡	10,584,000	
R	1	7	伊久美小受変電設備改修工事	受変電設備改修、キュービクル取替・高圧気中開閉器取替・電気工事一式	4,428,000
R	1	9	職員室空調機改修工事	職員室内空調機2台撤去、島四小から1台移設	939,600
R3	7	24	体育館女子便所改修工事	洋式1か所改修	299,200
