（様式６－１）　社会資本総合整備計画　事後評価書

計画の名称	77　島田市の道路施設長寿命化		
計画の期間	平成26年度　～　平成30年度　（５年間）	交付対象	静岡県島田市

計画の目標

経年劣化により健全度が限界を下回っている橋梁を始めとした道路施設について、安全性の確保及び長寿命化を目指す。
舗装の劣化、破損が著しい路線について修繕を行い、安全性の向上及び施設の長寿命化を目指す。
島田市地域防災計画で指定された緊急輸送路・避難路について拡幅改良を行い、防災・減災対策を強化する。
歩道の整備を行い、児童生徒の通学路の安全を確保する。

計画の成果目標（定量的指標）

①健全度ＨＩ＝60以下（重要路線は80以下）の橋梁の長寿命化
②維持管理指数（ＭＣＩ）＝5.0以下の箇所における舗装の長寿命化

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（H26当初）	中間目標値（H28末）	最終目標値（H30末）	備考
① 定義：健全度ＨＩ＝60以下（重要路線は80以下）の橋梁の対策完了数 算定：橋梁長寿命化修繕計画に基づく工事の完了数	0橋	－	59橋	
② 定義：維持管理指数（ＭＣＩ）≒5.0以下の箇所の舗装修繕完了延長 算定：路面性状調査により修繕が必要と判定された７路線の完了延長	0km	－	6km	
③				

全体事業費	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	1,995 百万円	Ａ	1,995 百万円	Ｂ	0 百万円	Ｃ	0 百万円	効果促進事業費の割合 Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	0%

静岡県社会資本整備重点計画における位置づけ

第２期（H20～H24）				第３期（H25～H29）			
分野名				分野名			
目標名				目標名			
指標名		目標値（H24）		指標名		目標値（H29）	

事　後　評　価

１．交付対象事業の進捗状況　（○：計画期間中に完成　△：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄）　－：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））
（計画期間中に他の整備計画に移行したもので、　●：本計画の期間中に完成　▲：本計画の期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄））

交付対象事業

A1　基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H25	H26	H27	H28	H29	全体事業費（百万円）	進捗状況	備考
77-A01-001	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（２）岸元島田線	舗装補修　L=0.95km	島田市	―	―	―	―		90	○	
77-A01-002	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（２）細島中央道線	舗装補修　L=0.9km	島田市	―	―	―	―		100	○	
77-A01-003	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（１）国道停車場線	舗装補修　L=0.38km	島田市			―	―	―	36	△	計画127へ移行
77-A01-004	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（１）本通り向谷線	舗装補修　L=1.1km	島田市		―	―	―	―	80	△	計画127へ移行
77-A01-005	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（１）番生寺島線	舗装補修　L=0.92km	島田市	―	―	―	―	―	104	△	計画127へ移行
77-A01-006	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（他）猪土居牧之原１号線ほか２路線	舗装補修　L=1.22km	島田市			―	―	―	102	△	計画127へ移行
77-A01-007	街路	一般	島田市	直接	島田市	S街路		（都）横井中央線	電共　L=0.37km	島田市		―	―	―	―	172	○	
77-A01-008	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（１）東町御請線	舗装補修　L=1.1km	島田市				―		330	○	
77-A01-009	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕・耐震事業	修繕工事　60橋	島田市	―	―	―			687	▲	計画52へ移行
77-A01-010	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	道路照明灯修繕事業	修繕工事　60本	島田市		―	―	―	―	36	△	計画127へ移行
77-A01-011	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	点検調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定見直し	島田市	―	―	―			133	▲	計画52へ移行
77-A01-012	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	点検調査	道路ストック総点検（トンネル）	トンネル点検	島田市	―					5	○	
77-A01-013	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	点検調査	道路ストック総点検（法面・盛土・擁壁等）	道路点検	島田市	―					12	○	
77-A01-014	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	点検調査	道路ストック総点検（標識）	道路点検	島田市		―	―	―	―	8	○	
77-A01-015	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（他）尾川上伊太線	道路法面補修　L=50m	島田市				―	―	25	△	計画127へ移行
77-A01-016	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（２）東町番生寺線	舗装修繕　L=0.65km	島田市				―	―	40	○	
77-A01-017	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	道路ストック総点検（舗装）	舗装点検	島田市				―		3	○	
77-A01-018	道路	一般	島田市	直接	島田市	市町村道	修繕	（２）大津通り線	舗装修繕　L=0.3km	島田市					―	32	△	計画127へ移行
													合計			1,995		

B　関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度） H25	H26	H27	H28	H29	全体事業費（百万円）	進捗状況	備考
												合計					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C　効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	進捗状況	備考
										H25	H26	H27	H28	H29			
												合計					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

（参考）　計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況					・事業期間内に目標を達成することはできなかったが、重要な路線（舗装及び橋梁）を優先的に修繕し、交通環境が改善されたため、市民の安全安心を向上させた。
Ⅱ定量的指標の達成状況	指標① 健全度ＨＩ＝60以下（重要路線は80以下）の橋梁の対策完了数	最終目標値	59橋	目標値と実績値に差が出た要因	・断面修復の施工にあたり、現地調査結果を基に劣化部の取壊しを行ったところ、想定範囲以上に劣化が進行していたことにより施工数量が増加した。それに伴い工事期間が延び計画期間内に対象事業が完了しなかったため目標値を達成することができなかった。
		最終実績値	40橋		
	指標② 維持管理指数（ＭＣＩ）≒5.0以下の箇所の舗装修繕完了延長	最終目標値	6.00km	目標値と実績値に差が出た要因	・目標設定時には想定していなかった路床部分の入れ替えや安定処理を実施したことにより工期が延び計画期間内に対象事業が完了しなかったため目標値を達成することができなかった。
		最終実績値	3.50km		
	指標③（　）	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況					・舗装補修により車（特に大型車）の通行時の騒音が軽減し、沿線の住環境が改善された。 ・道路照明灯のLED化により都市景観と調和が取れた。

３．特記事項（今後の方針等）

・未完了の事業については、平成31年度から新たな整備計画「島田市の道路長寿命化（H31～R5）」に引き継がれて、限りある財源の中で効果的に事業を推進する。また、目標数に達しなかった橋梁修繕19橋については平成31年3月に見直しを行った「島田市橋梁長寿命化修繕計画」に盛り込み計画的に修繕を行う。

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
島田市社会資本総合整備計画評価委員会による。	令和２年３月
	公表の方法
	HPで公表

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　参考図面
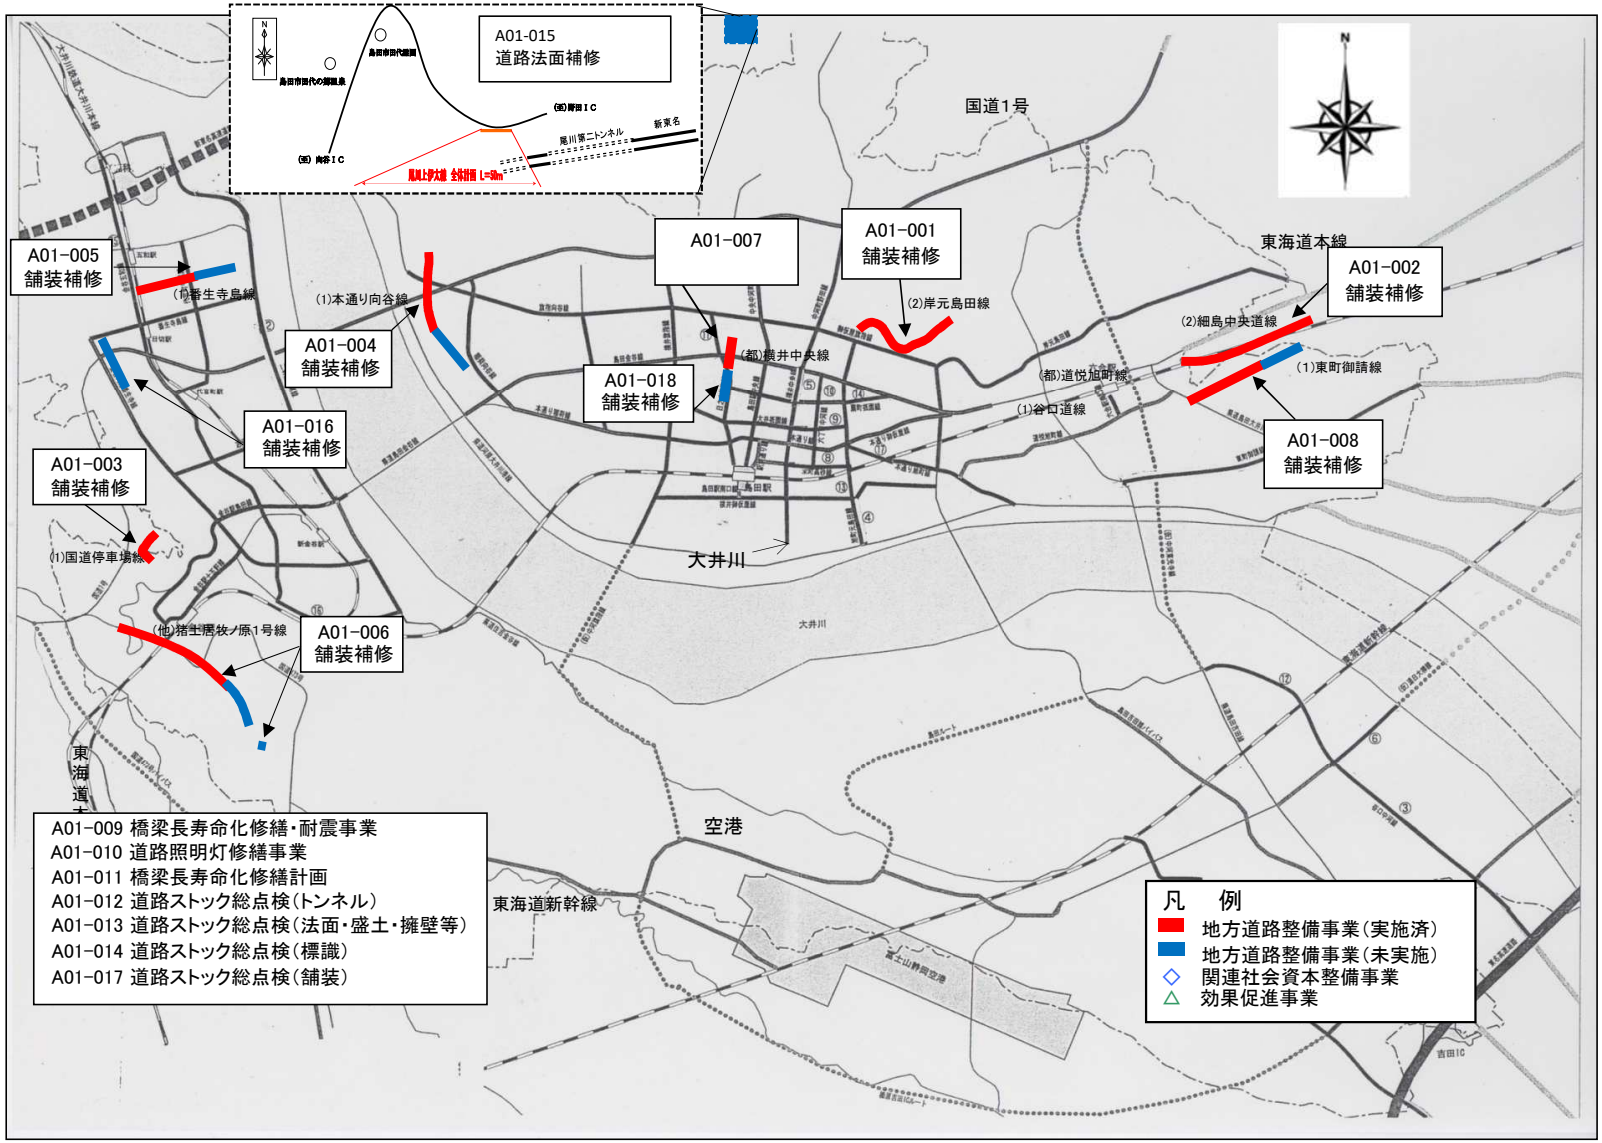
計画の名称	77 島田市の道路施設長寿命化		
計画の期間	平成26年度～平成30年度（５年間）	交付団体	島田市
